

TALLINNA  
TEHNIKAKÕRGGKOO

# Projektijuhtimine

Tiit Valm

INSENERIAKADEEMIA

Kaasrahanud  
Euroopa Liit

Eesti  
tuleviku heaks

1

## Teemad

- Projekt
- Projektijuhi roll
- Kokkulepete kindlustamise keerukus
- Üks soovitus edukuse tagamiseks
- Küsimused/vastused

INSENERI-  
AKADEEMIA

Kaasrahanud  
Euroopa Liit

Eesti  
tuleviku heaks

2



3



4

# Etapid ja alamprojektid

Millal kaasatakse raha?

RAHA ARMASTAB TÄHTAEGA!

Lepinguline tähtaeg

Etapp 1.1, Etapp 1.2, Etapp 1.3, Etapp 1.4, Etapp 1.5

Etapp 1, Etapp 2, Aeg

Suurte ja mitte ainult suurte projektide juures on algus keeruline ja aegavõttev!

INSENERI-  
AKADEEMIA

Kaasrahasaanud  
Euroopa Liit

Eesti  
tuleviku heaks

5

# Millal kaob aeg ja millal kasumlikkus?

Aeg põleb alguses

Raha põleb lõpus

Kõik mis läheb kiireks läheb kalliks!

Aeg

Alustamisega viivitamine:


- koostöö algus venib;
- etapi algus venib;
- päeva algus venib;
- töö algus venib.

INSENERI-  
AKADEEMIA

Kaasrahasaanud  
Euroopa Liit

Eesti  
tuleviku heaks

6

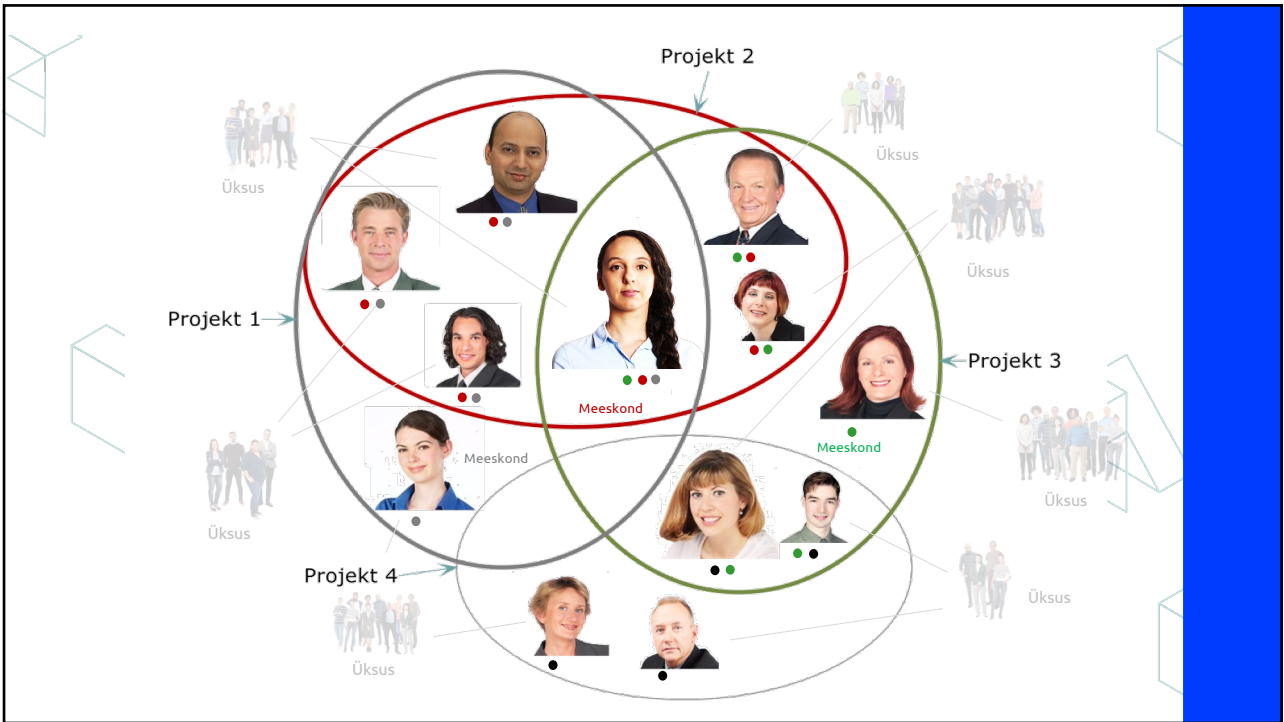

7

# Inimesed seavad oma tegevustes prioriteetid emotsioonide põhjal.



Richard H. Thaler

2017. aastal pälvis Thaler Nobeli majandusauhinna oma panuse eest käitumisökonomikasse.

Sisu: Majandusteooria põhieeldus seisneb selles, et inimesed teevad oma valikuid ratsionaalselt st optimeerides.

Käitumisökonomika seisukohalt teevad inimesed 100% emotsionaalseid otsuseid.



8

# Teeme valikud selle põhjal, mis TUNDUB hetkel tähtis.

Tööde vastuvõtmisel antakse lubadus tunnete põhjal, kas jõuab või ei.

Mida hetkel teha määrab see, mis tundub hetkel olulisem.

Projekti lõpuni 3 kuud

Kiire töö homseks

INSENERI- AKADEEMIA

Kaasrahasaanud Euroopa Liit

Eesti tuleviku heaks

9

# Projekti üldised piirangud

Koostöö korraldamise teadmised oskused ja kogemus

Aeg

Raha

Tulemus

Teadmised finants-arvestusest

Projektijuhi jaoks vajaliku juriidilise tausta teadmine

Valdkonna ja eriala teadmised oskused ja kogemus

INSENERI- AKADEEMIA

Kaasrahasaanud Euroopa Liit

Eesti tuleviku heaks

10

# Projektijuhi roll



Projektijuhi roll on koostöö korraldamine.

Koostöö korraldamise keerukused:

- ajutine meeskond;
- piiratud õigused;
- inimesed seavad oma tegevustes prioriteetid emotsioonide põhjal.

11

# Projekti edukus ja projektijuhtimise edukus



Projekti edukus



On tagatud kokkulepitud tulemus.  
Tulemus on valmis tähtjaks.  
Maksumus jäi eelarve piiridesse.

Projekti juhtimise edukus



Millised võiksid olla eduka projektijuhtimise kriteeriumid?

12

# Üks soovitus projekti edukuse tagamiseks



**KÕIK ALGUSED KIIREKS!**

Algustes tekivad kõige suuremad ajakaod.

